

GIORNALE DEI LAVORI

PIERINI ADELMO
Via Torricella 14 - Loc. TAVARNUZZE
IMPRUNETA - (FI)

OPERE DI URBANIZZAZIONE
CENTRO STORICO
DI

GREVE IN CHIANTI

AREA EX PANTINE SEVA

Data	
28/05	Annotazioni Speciali e Generali sull'Andamento e modo di Esecuzione dei lavori, sugli Avvenimenti Straordinari e sul Tempo utilmente Impiegato
504	Sopraluogo congiunto

28/06/05
Opere di Urbanizzazione del P.d.R. del Centro
Storico


Da un sopralluogo effettuato alla presenza
del D.L. Ing. Martini, dell'Ing. Dupuis, dell'Ing.
Pierini e Morrocchi per Coinos e Pacent
per Fogliozzi e Checucci è emersa
una lieve discordanza di quote altimetriche. Il D. Ing. Pacent ha fornito
un rilievo topografico. Il Direttore
dei lavori lo verificherà in funzione
del progetto e entro una settimana
deve aver comunicato se i lavori
potranno essere ripresi. Contestualmente

OPERAI ED ALTRI MEZZI D'OPERA IMPIEGATI DALL'IMPRESA

Osservazioni ed Istruzioni del Direttore dei lavori

Contestualmente la perimetrazione in
cassina l'area si con-
ferma la sospensione dei
lavori.

[Signature]

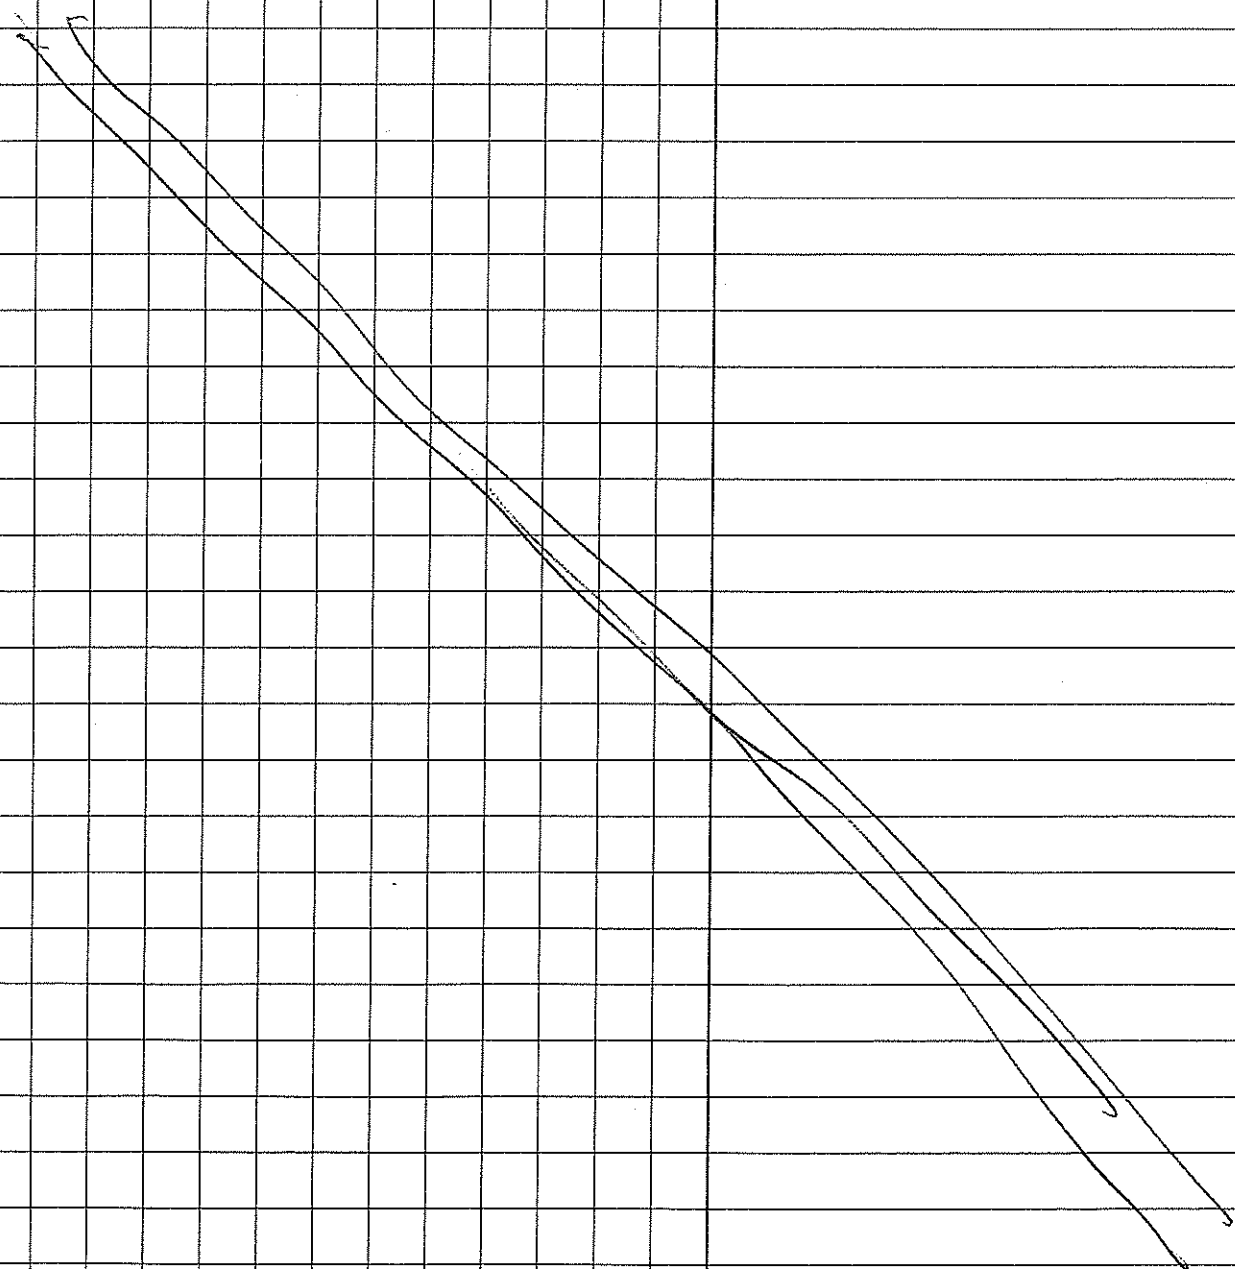

Data	
<u>2005</u>	Annotazioni Speciali e Generali sull'Andamento e modo di Esecuzione dei lavori, sugli Avvenimenti Straordinari e sul Tempo utilmente impiegato
0504	Sopra l'uso consegnato

20/06/05

20/06/03
Bresce di Valcanizza via del P. A. R. del Centro
Sforzo

a un appello go offuscato che pareva
 di D. L. Ing. Martini, dell'Ing. Dupuis, dell'Ing.
 Ierini e Morocchi per convincere a Packer
 nel fogliozzi e Chacucci è ancora
 una lice di discordia una di quelle altre
 metriche. Il Prof. Ing. Packer ha fornito
 un rilievo topografico, il Prof. D'Adda
 ha lavorato lo stabilimento in funzione
 del progetto e tutto una settimana
 a ogni considerazione se i lavori
 possono essere ripresi. Concludendo
 vuole Chacucci di neppure a vedere
 il Prof. Packer.

John



OPERA! ED ALTRI MEZZI D

Coast
Coast
Coast

Bufelli 3131 (e)

OPERAI ED ALTRI MEZZI D'OPERA IMPIEGATI DALL'IMPRESA										Osservazioni ed Istruzioni del Direttore dei lavori
Etc.	Operai	Mis impiegate								
8	16	8								
8	16	8								
8	16	8								
8	16	8								
8	16	8								
-	16	-								9-2-2006 *1 Double Captain <i>[Signature]</i>
8	16	8								
16										
16										
16										
8	16	8								
16										
16										

[illegible]

Data		Annotazioni Speciali e Generali
		sull'Andamento e modo di Esecuzione dei lavori, sugli Avvenimenti Straordinari e sul Tempo utilmente Impiegato
9	10	SEGUE LAVORI STRADA DI ACCESSO ALLA PIAZZA UMI 14
10	10	SCAVI PER POSA TUBAZIONI FOGNATURA ED IMPIANTO ELETTRICO CADITOIE CORDONATI E ZANECCE
11	10	SEGUE LAVORI COME SOPRA
12	10	" "
13	10	SOSTITUITO TUBO Ø 200 DELLA FOGNATURA CHE ATTRAVERSA IL BORRO DI MONTEFIORALLE PERCHÉ INTASATA - TUBO DI SERVIZIO DELLE UMI 9-10-11-12-13
16	10	SEGUE LAVORO COME SOPRA
17	10	DEMOLIZIONE MURO DI PARAPETTO LUNGO LA PROVINCIALE
18	10	SEGUE LAVORO COME SOPRA
19	10	DEMOLIZIONE PLINTI PER PALO ILLUMINAZIONE E RICOSTRUZIONE PER VARIAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE RICHIESTO DAL COMUNE IN DATA 26.9.2005
20	10	SEGUE LAVORI COME SOPRA
23	10	" "
24	10	" "
25	10	MONTAGGIO GRIGLIE IN GHISA E CHIUSINI STRADALI INGHIAIA RULLATURA
26	10	" "
27	10	MESSO A DIMORA LEPIANTE NELLA PIAZZETTA COME DA SPECIFICA FORNITA DAL GEOM. ERMINI FATTO PURE IL
30	10	RIALZAMENTO CHIUSINI SU VIA DELLE CAPANNE PER LA PREPARAZIONE ALL'ASFALTATURA - RIALZATO PURE TRATTO DI ZANECCE DOPPIO PETTO E GRIGLIE ESISTENTI.
31	10	SEGUE LAVORI COME SOPRA ED INIZIO ASFALTATURA
2	10	" DA ASFALTATURA "
3	10	" " "
		FINE LAVORI DI ASFALTATURA
01	2007	MONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO
2	07	MONTAGGIO RINGHIERA PASSERELLA
2	07	SEMINAGIONE PRATO
2	07	SOSPENSIONE LAVORI PER DIMISSIONI DEL D.L. ING. MARTINI

OPERAI ED ALTRI MEZZI D'OPERA IMPIEGATI DALL'IMPRESA							Osservazioni ed Istruzioni del Direttore dei lavori
OPERARIO	ESC.	MOTO PULV.	AUTOGRU	RULLO	FINITRICE	AUTOGRU	
24	8	8	8	8			
24	8	8	8	8			
24	8	8	-	-			
24	8	8	-	-			
24	8	8	-	-			
24	8	8	-	-			
24	8	8	-	-			
24	8	8	8	-	-	8	
24	8	8	8	-	-	8	
24	8	-	8	-	-	-	
24	8	-	-	-	-	-	
24	8	-	-	-	-	-	
24	8	8	-	-	-	-	
24	-	8	-	8	-	-	
24	-	8	8	8	-	-	
64	-	8	8	-	-	-	
24	8	8	8	-	-	-	
64	-	8	8	8	8	-	
64	-	8	24	8	8	-	
64	-	8	24	8	8	-	
24	-	-	-	-	-	8	
24	-	-	-	-	-	-	
32	8	-	-	-	-	3	

